

大滝トンネルメーター

(ホームページ)



令和6年3月19日(火)

貫通

令和6年12月21日(土)現在 No.129

【経過状況】

①掘削開始からの経過日数	掘削開始 R4. 5. 13	954 日
②掘削延長 (上半) 完了		2,053.0 m
③掘削延長 (下半) 完了		2,053.0 m
④インバート 完了		258.6 m
⑤覆工コンクリート		2048.0 m

大滝トンネル設計延長 2,053m(NO.13+3.0~NO.115+16.0)

【秩父側坑口】

【山梨側坑口】




【作業状況】

⑥覆工打設ポイント	NO. 115+11.0
⑦日進(週間平均)/週進/月進(前月)	0.0 m/ 0.0 m/ 30.3 m

【施工状況】

●終点側坑門工 型枠組立状況
2024.12.18

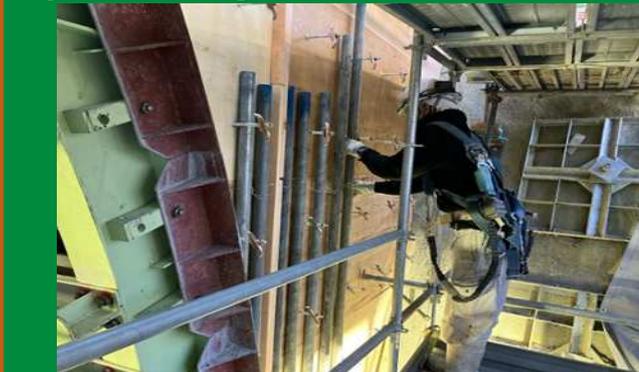

【施工状況】

●終点側坑門工 型枠組立状況
2024.12.21



(発注者)埼玉県西関東連絡道路建設事務所 / (施工者)大林・西武・斎藤特定建設工事共同企業体
