

かすかべ連立ニュース

第16号 令和8年8月発行



工事情報
埼玉県鉄道高架
建設事務所HP



工事説明動画
工事概要について
(YouTube)



事業リーフレットへのリンク
(埼玉県HP内)

発行者
埼玉県鉄道高架建設事務所
春日部市鉄道高架株式会社

令和7年10月5日(日)より伊勢崎仮下り線・仮下りホームの供用を開始しました。
引き続き、鉄道高架化のスペースを確保するため、野田仮上下線の工事等を進めていきます。

用地確保の進捗率 96.8%
(令和8年7月末時点)

現在の工事等進捗状況

①野田線仮ホーム新設工事



ホーム上家鉄骨工事 施工状況




仮ホーム基礎工事 施工状況


②富士見町地下道西側延伸工事



地下道コンクリート工事 施工状況

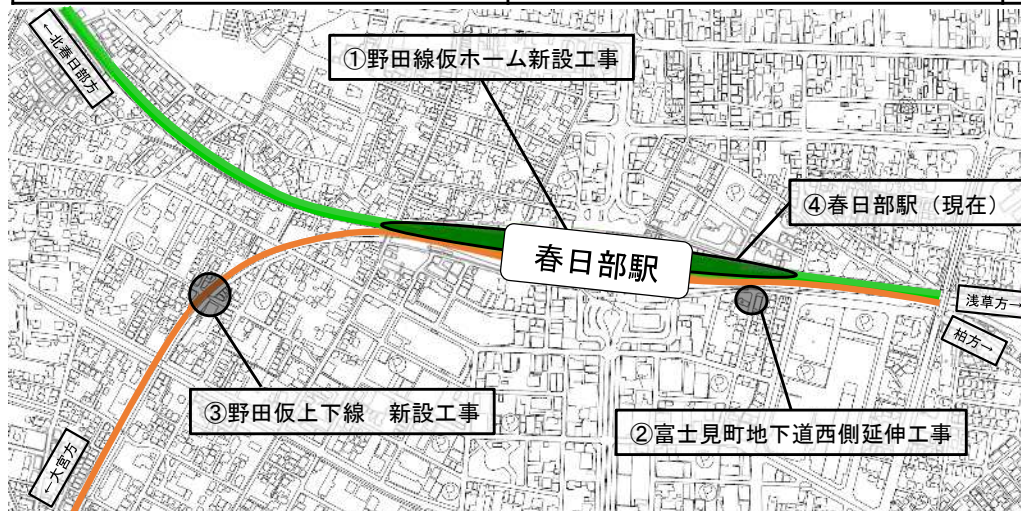

伊勢崎仮上下線施工範囲
(切替え済み)
野田仮上下線施工範囲

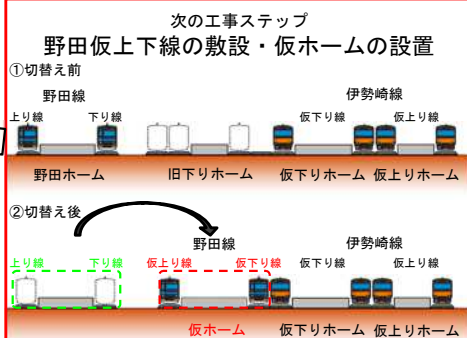

③野田仮上下線 新設工事



野田線88号踏切道 軌道工事施工中



野田線89号踏切道 軌道工事施工中

④春日部駅（現在）



春日部駅構内工事施工状況

①野田線仮ホーム新設工事

野田仮上下線切替えに向け、伊勢崎線旧下りホームの改修を行い、野田線仮ホームとして使うための工事を行っています。
現在はホーム上家の鉄骨工事およびホームの基礎工事を行っています。

②富士見町地下道西側延伸工事

富士見町地下道の西側出入口は、今後予定されている高架橋工事に支障となることから、地下道の延伸工事を行っています。
現在は、延伸となる地下道のコンクリート打設を行っています。
また、工事の進捗に合わせて同地下道前面道路が当面、車両通行止めとなります。（歩行者は通行可能です。）
通行止めについての情報は、埼玉県HPにてご確認ください。

③野田仮上下線新設工事

八木崎駅～春日部駅間について、施工可能な範囲から順次路盤工事を行っており、路盤工事が完了した範囲から順次仮線軌道新設工事を行っています。現在は第89号踏切道付近の路盤工事および軌道新設工事を行っています。
