

## 事後評価概要


|      |            |        |               |
|------|------------|--------|---------------|
| 事業名  | ほ場整備事業     | 地区名    | やまた<br>山田     |
| 事業箇所 | 滑川町        | 事業実施機関 | 東松山農林振興センター   |
| 総事業費 | 9億2029万3千円 | 事業期間   | 平成19年度～平成29年度 |

**事業目的**  
 道路・用排水路の整備、区画の大型化を行い、担い手農家の育成や農地の利用集積を進め、効率的かつ安定的な農業を確立する

**事業内容**

- 区画整理：44.7 ha
- 整地工：42.1 ha、用水路工：6.5 km、
- 排水路工：7.0 km、道路工：7.7 km、
- 暗渠排水：37.1 ha

**平面図**

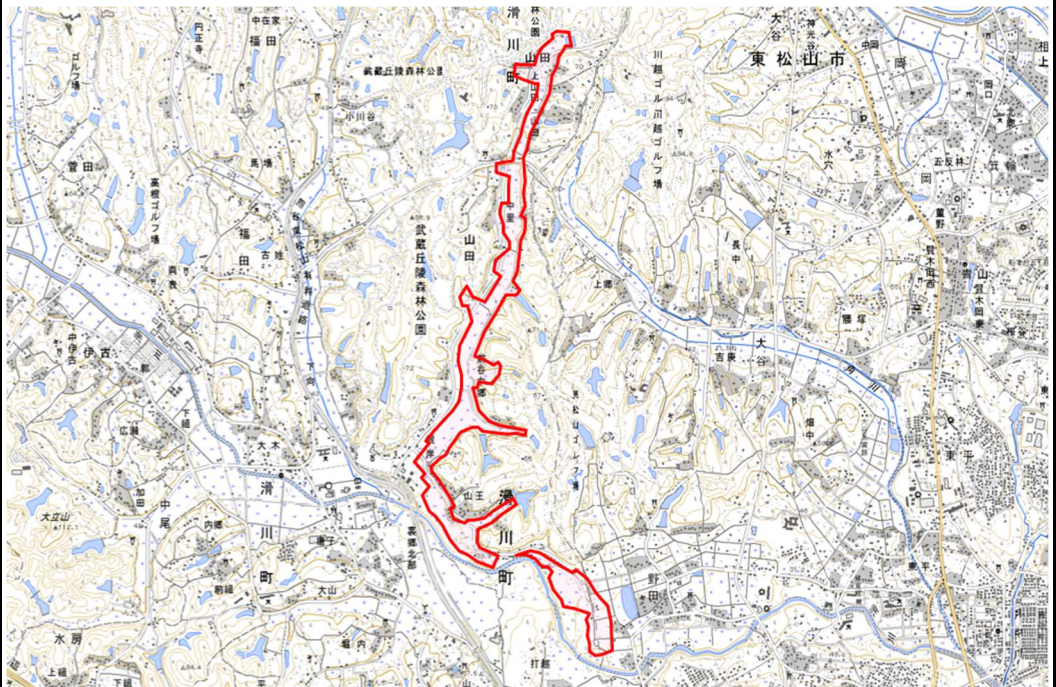

事業の概要

事業実施前と現在での比較

|           | 実 施 前  | 目 標 (H28年) | 現 在     |
|-----------|--------|------------|---------|
| 担い手数      | 3名     | 9名         | 5名      |
| 担い手への集積面積 | 2.95ha | 15.5ha     | 25.02ha |

事業効果

農地中間管理機構を通じて集積されており、目標よりも担い手への農地の集積が進んでいる。

特に1名の担い手については、集積面積が約16haにまで達している。

その他

事業実施前



平成 18 年度

現在



令和 5 年度



事後評価結果

・本事業により大区画農地になったことで、担い手への農地利用集積が進み、効率的な農業経営が営まれている。
