かすかべ連立ニュース

工事情報
埼玉県鉄道高架
建設事務所HP

工事説明動画
工事概要について
（YouTube）

事業リーフレットへのリンク
（埼玉県ＨＰ内）

第９号　令和６年１１月発行

発行者
埼玉県鉄道高架建設事務所
春日部市鉄道高架推進課
東武鉄道株式会社

令和６年５月１２日より伊勢崎線仮上り線・仮上りホームを供用開始しました。
引き続き、鉄道高架化のスペースを確保するため、伊勢崎線仮下り線の工事等を進めていきます。

用地確保の進捗率　８２．９％
（令和６年１０月末時点）

現在の工事等進捗状況

①旧伊勢崎線上りホーム撤去・伊勢崎線仮下りホーム新設工事

②野田線仮上下線路盤工事

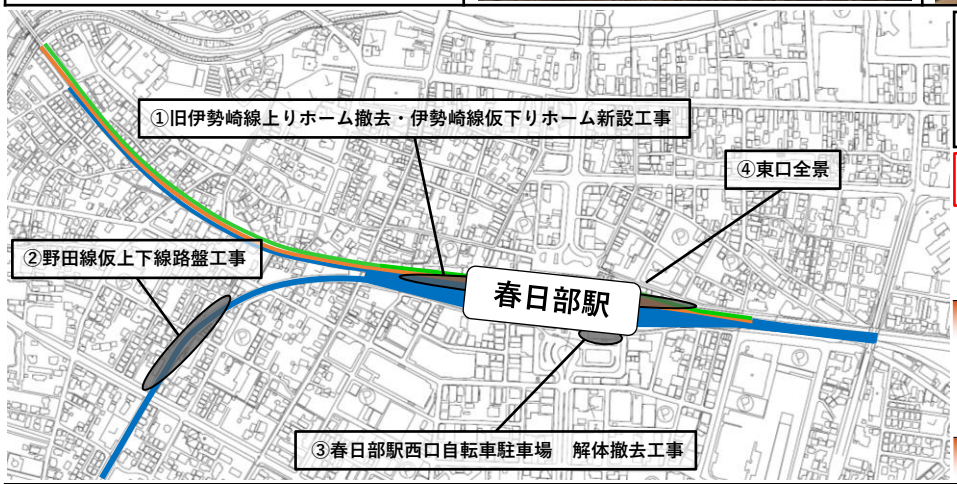

伊勢崎線仮上り線施工範囲（切替済み）
伊勢崎線仮下り線施工範囲
高架化範囲

次の工事ステップ
伊勢崎線仮下り線の敷設・仮下りホームの設置

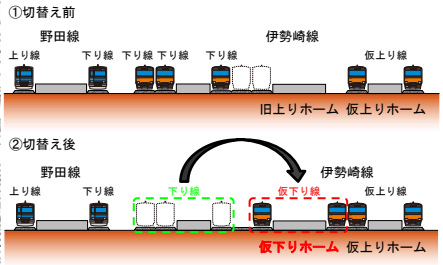

③春日部駅西口自転車駐車場　解体撤去工事

④東口全景

①旧伊勢崎線上りホーム撤去・伊勢崎線仮下りホーム新設工事
　旧伊勢崎線上りホームは、上家解体および盛土ホーム撤去が概ね完了しました。現在は伊勢崎線仮下りホーム新設に向けた杭打設等に着手しています。

②野田線仮上下線路盤工事
　野田線については、伊勢崎線仮下り線への切替え後に、上下線を２線同時に仮線切替えする計画です。
　現在は、八木崎駅～春日部駅間において、施工可能な範囲から順次路盤工事を進めています。

③春日部駅西口自転車駐車場　解体撤去工事
　高架橋工事に支障するため、春日部駅西口自転車駐車場の解体工事を行っています。自転車ラックなどの設備撤去が完了し、現在は建物の解体を進めています。
　今後は、地下ピットの撤去工事に着手していきます。

④東口全景
　伊勢崎線仮下り線の切替えに向け、伊勢崎線仮下りホームの新設工事等を進めています。
